



【27年1月】一部の教室及び体育館の改修工事がほぼ完了してきました。写真は普通教室です。天井、窓、壁や黒板が新しくなり、床が磨き直されて室内がとても明るく開放的な雰囲気に変わりました。黒板の横には新しいテレビ台が取り付けられています。窓の外には外壁を工事するために校舎の周囲に設置されている足場が見えていますが、一部を残して1月末までに取り外される予定です。



音楽室です。床が木材のフローリングに張り替えられ、音符を記入するための五線譜が書かれた新しい黒板が取り付けられています。室内照明のスイッチ類や電源コンセント類はこれから取り付けられます。写真左側奥に見える部屋は音楽準備室、右側には出入口が見えます。



体育館では壁の張り替えや塗り直し、床の磨き直しが行われました。床にはバスケットボールやバレーボールなどの球技を行うためのラインが引き直されています。




【26年12月】

校舎北棟外壁の改修が進み、仮囲いが外されました。校舎外壁のクリーム色、ブレース(耐震補強材)のベージュ色、庇(ひさし)のこげ茶色の三色に塗り分けられた真新しい校舎が朝の光に照らされて明るく輝いています。



教室の改修も進んでいます。床や天井などが張られて来ました。窓の上部は従来のガラスブロックからアルミサッシに改修され、教室内部が一段と明るくなりました。

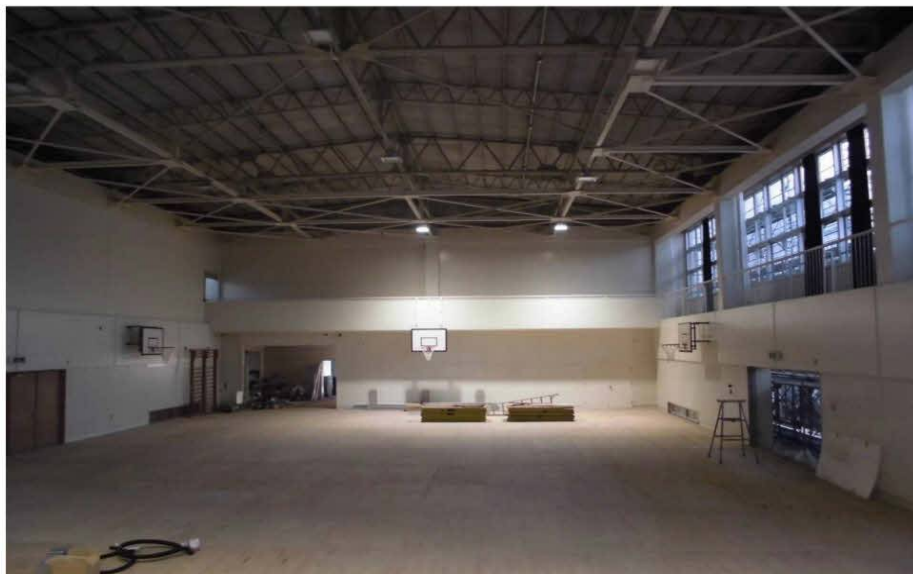

天井照明のLEDへの改修や、壁の塗装のために組み上げられていた足場が外されました。今後は床の改修等をおこなっていきます。





【26年11月】

改修中の校舎内部です。古くなった壁や床を取り除き、新しい断熱材などが取り付けられている様子です。上から出ている棒状の資材は天井を設置するための下地材です。この下地材に天井を固定するフレームを取り付けます。



パイプで囲まれた部分にはエレベーターが新たに設置されます。建物の強度を確保するため、天井部分に鉄骨が組まれています。



校舎、体育館と合わせて、プールについても改修工事が行われます。古くなったプールサイドの床を取り外してプールの水を循環させる配管を取り換える作業を行っています。



【平成26年9月】

2学期に入り、仮設校舎での授業が始まり、子ども達が元気に登下校する様子が見られます。



本校舎では、外部は作業シートに覆われ、改修工事が本格的に始められています。





改修中の本校舎内部です。壁の多くは撤去され、建物を支える部分のみが残っています。



体育館内部です。天井が高いため、作業用の足場が組まれています。





平成26年7月25日

第九小学校の仮設校舎の建築工事が終わり、本校舎や体育館からの荷物の引越し作業が進んでいます。写真は仮設校舎一階の音楽室に備品を運んでいる様子です。引越し業者の人たちが台車を使って楽器などを次々に運び込んで行きます。

仮設校舎への引越し作業が終わると、学校の先生方が新しい教室で荷物の整理などを行い、二学期からの授業開始に向けて準備を進めていきます。



平成26年6月17日

南棟に続いて北棟の外観がほぼ完成しました。北棟には校長室、職員室、保健室や、音楽室、理科室、図工室、家庭科室などの教室が入ります。今後は空調機などの設置や、床や内装などの工事が行われていきます。



平成26年6月4日

仮設校舎の建設が順調に進んでいます。南棟の外観がほぼ完成しました。南棟には各学年の教室、くわのみ教室、図書室、学童保育所などが入ります。



平成26年5月22日

クレーン車を使った作業が始まりました。床や壁の取り付け工事が進み、仮設校舎の形が現れ始めています。



平成26年5月7日

仮設校舎の基礎を作るために木製の型枠を設置して、コンクリート流し込み固めている様子が分かります。





平成26年4月16日

写真左側の上から下に向けて仮設校舎の基礎部分を作るために校庭が掘削され、写真の左側の下から右側に向けて白線が引かれていて、仮設校舎の位置がよく分かります。



平成26年4月16日

写真右側上段に【EV】と書かれている部分があります。この場所にエレベーターを設置する予定であることが分かります。
