

第五小学校校舎増築工事について

1 経緯・進捗状況

- 小学校 35 人学級へ対応するため、令和 4 年 5 月末に校舎増築工事の現場に着手
- 工事施工前には、工事事業者が近隣住民に校舎増築工事のお知らせを配布し、工事車両の通行経路等について周知を行ったが、多数の大型車等が通行することに対し、自治会や近隣住民から不安の声が寄せられたため、9月に沿道住民等から意見をお伺いする機会を設けたほか、改めて 10 月に説明会を開催し、今後の対応策を説明
- 工事用車両の通行する道路の状態について認識が不足しており、下水道取付管の不具合が令和 4 年 9 月に判明。そのまま工事を継続することは安全性を確保できないと判断し、工事を一時中断
- 下水道取付管及びアスファルト舗装の改修を行い、工事車両対策を行ったうえで工事を継続
- 令和 5 年 4 月から増築校舎で授業が開始できるよう、安全面に配慮しつつ、3 月末の完成に向け工事を進めてきたが、工期が厳しい状況であり、4 月当初からの増築校舎の供用開始が難しい状況。そのため、1 月に第 2 回説明会を開催し、今後の工事施工条件の変更や工期限の延伸等を説明

2 今後の工事施工条件の変更

- 日曜日・祝日の施工
- 工事終了時間を 18:00 から 20:30 に変更
- 工事開始時間を 8:30 から 8:00 に変更
- 変更となる時期については、裏面の「工事工程表」に記載

3 工期限の延伸（予定）

- 令和 5 年 3 月 24 日（金） → 令和 5 年 4 月 28 日（金）

4 増築校舎での授業開始（予定）


- 令和 5 年 5 月 8 日（月）

5 令和 5 年度のクラス数の推計・現校舎における普通教室への転用

年度	クラス数						合計
	1 年生	2 年生	3 年生	4 年生	5 年生	6 年生	
R4（実数）	4	4	3	3	3	3	20
R5（推計）	4	4	4	4	3	3	22

- 上記の表のとおり、令和 5 年度のクラス数の推計は 22 クラスとなり、2 クラス増える予定
※令和 4 年度は 3 年生までが 35 人学級・令和 5 年度は 4 年生までが 35 人学級
- 現校舎にある英語ルーム（2 階）及び多目的室（3 階）の大きさは普通教室と同規模であり、この 2 部屋の設えについて一部修繕等を行い、増築校舎の供用開始までの間、普通教室へ転用し対応予定
(令和 5 年 4 月 6 日（木）から 5 月 7 日（日）までの間)

工事工程表

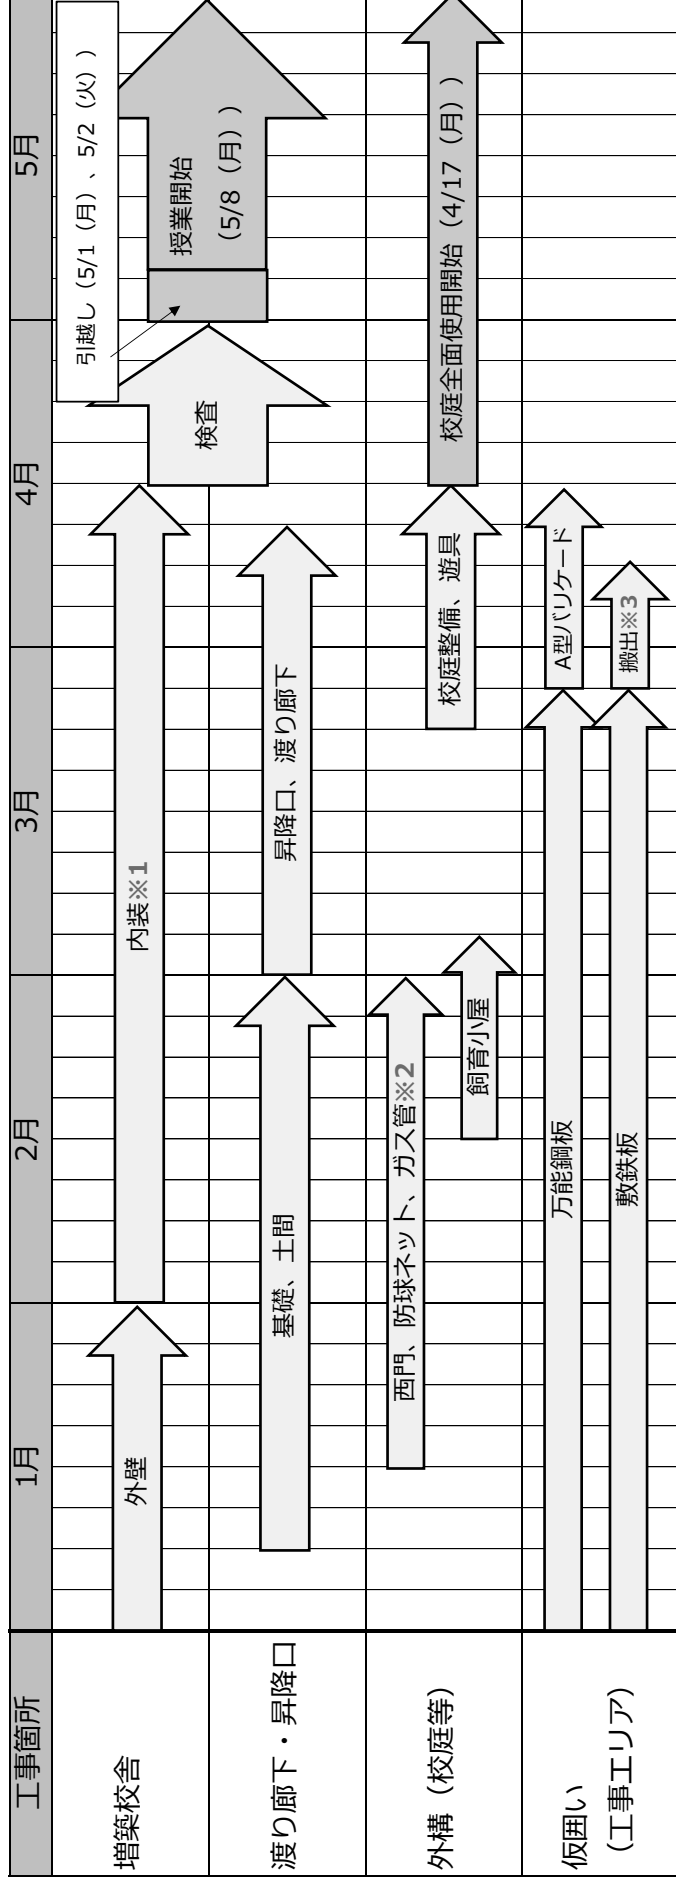

※1 内装工事の始まる2月から次の施工条件で工事を実施

【施工条件】

1. 日曜日・祝日の施工
 2. 工事終了時間を18:00から20:30に変更
 - ※ 20:00まで施工、その後片付け、20:30退出
 3. 工事開始時間を8:30から8:00に変更
 - ※ 工事関係車両の登校時間 (7:30~8:30) の通行禁止
 - ※ 8:00から音が出る場合あり (重機の大きい音は今までどおり8:30以降)
- ※2 敷地西側道路において車両通行止めを実施 (西門施工時連続5日間、ガス管施工時1日間 計6日間程度を予定)
 通行止めの日程及び範囲については、近隣住民へお知らせを配布
 車両通行止めを行う6日間のほかに、一部道路上に工事車両を停めて作業を実施。車両・歩行者とも通行は可能 (交通誘導員が誘導)

※3 大型車 (10 t 車) が通行 (約4台×4日 計約16台)

敷鉄板搬出以外の時期にも大型車 (10 t 車) が通行する場合あり

大型車の搬入日程については、工事車両搬入口及び敷地西側に週間工程表を掲示
